



АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

АУДИТЫН КОД: АРА-2026/05-1/ШТА-НА

АУДИТЫН ТАЙЛАНТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ
МЭДЭЭЛЛИЙГ QR КОД БОЛОН WWW.AUDIT.MN
ЦАХИМ ХУУДАСНААС АВНА УУ






УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

АУДИТЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Тайлант жилд 5 Сайдын багцаас аймгийн Засаг даргад өмнөх оноос үргэлжлүүлэх нийт 20 төсөл, арга хэмжээний эрхийг шилжүүлж:

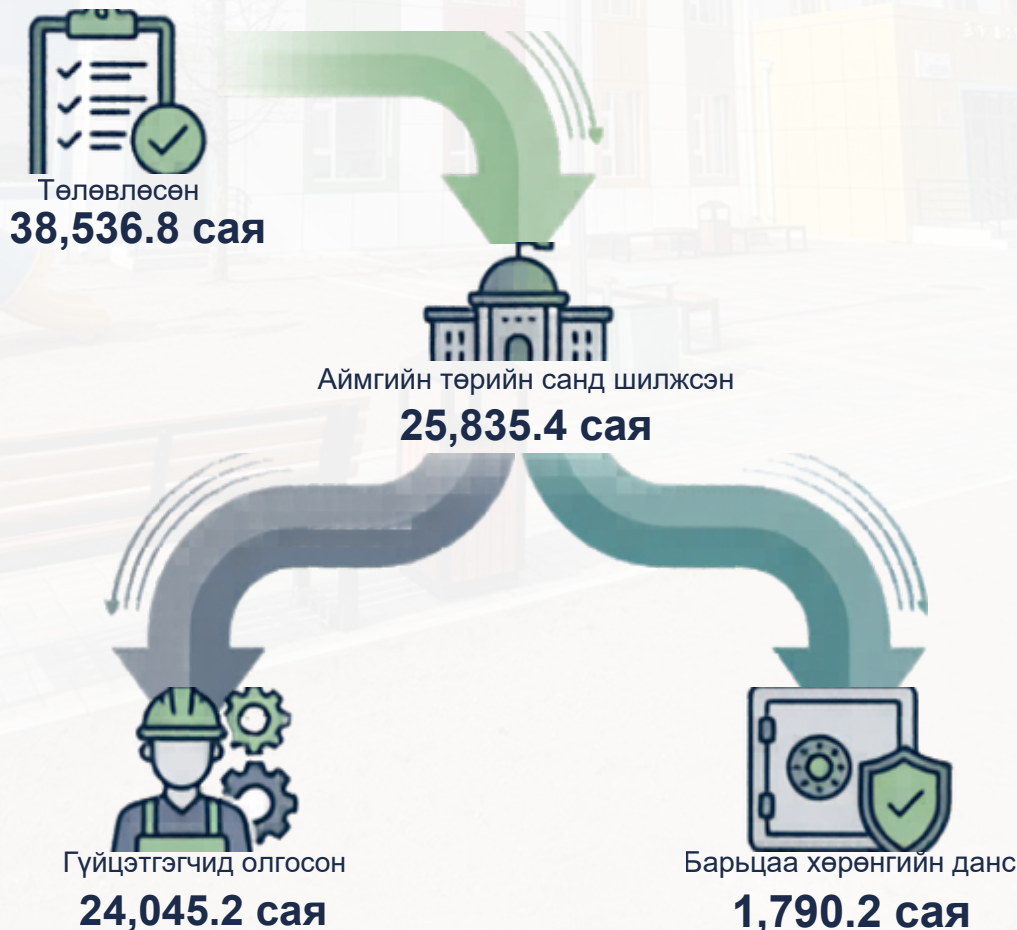



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

1

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НИЙТ 41 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ ХҮРГҮҮЛСЭН БОЛОВЧ ҮҮНЭЭС ЗӨВХӨН 1 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ ТУСГАГДСАН БАЙНА.



ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ САЙДЫН БАГЦААР

Санхүүжих дүн

Зам, тээврийн хөгжлийн яам	13 төсөл	243.3 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
Эрүүл мэндийн яам	10 төсөл	32.5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам	6 төсөл	24.2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
Бусад сайдын багц	6 төсөл	26.8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
ХХББОСС	3 төсөл	37.2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
Эрчим хүчний яам	3 төсөл	38.7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

2 УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИХ 6 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ НЬ ТӨСӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БАЙНА

ТЭЗ	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хугацаа		Төсвийн хуулиар баталсан		Аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
		Эхлэх 	Дуусах 	Төсөвт өртөг 	Санхүүжих дүн 	
ШЕЗ	Архангай аймаг дахь шүүхийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2025	2026	8,043.30 сая ₮	3,469.90 сая ₮	-
ХХААХҮС	1. Архангай аймгийн бэлчээрт инженерийн хийцтэй 3 худаг шинээр барьж байгуулах ажил	2025	2025	94.8 сая ₮	94.8 сая ₮	3.17.1
ЗТС	Өгий нуур - Мянганы замын хэсэгт тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангалт бүс/	2025	2026	43,603.20 сая ₮	17,989.40 сая ₮	1.3.1.
ХББОСС	Төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах цогц хөтөлбөр, 1 дүгээр үе шат /Архангай аймгийн Хотонт, Ихтамир, Чулуут, Өлзийт, Хашаат сум/	2025	2027	5,791.60 сая ₮	51.8 сая ₮	1.2.2.
ЭХС	1. Сум, суурин газрын цахилгаан хангамж /Архангай, Чулуут сум Зүүнмод баг/ 2. Сум, суурин газрын цахилгаан хангамж /Архангай, Өндөр-Улаан сум, Баянгол баг/ 1. Сумын төвийн 0.4 кВ-ын шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2025	2026	2,205.20 сая ₮	1,703.80 сая ₮	3.8.3, 3.9.6
ЭЗХС	Багц-1: Сувилахуйн сургалт, эрдэм шинжилгээ, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний цогцолборын зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ Багц-2: Өндөр-Улаан сумын Хануйн бүрнээс Эрдэнэмандал сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто замын ТЭЗҮ, зураг төсөв /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2025	2025	1,279.00 сая ₮	1,279.00 сая ₮	2.17.4

**Бодлогын баримт
бичигтэй уялгсан**



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

3 АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ДУУСАХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН ТАХ-НИЙ 83.7 ХУВЬ НЬ ХУГАЦААНДАА ХЭРЭГЖСЭН БАЙНА

ЭРХ ШИЛЖСЭН – 20 ТАХ

Гэрээний үнийн дүн
192,672.4
сая төгрөг

Барилга, байгууламж
19
ТАХ (95%)

Тоног төхөөрөмж
1
ТАХ (5%)

Эрх шилжин хэрэгжсэн 20 ТАХ-ээс:

- Гэрээний хугацаагаар он дамжин хэрэгжих ТАХ: **10** ТАХ
- Тухайн онд хэрэгжүүлж дуусахаар төлөвлөсөн ТАХ: **10** ТАХ

ХЭРЭГЖИЛТ



- Төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжиж, ашиглалтад оруулсан **8** ТАХ
- Гүйцэтгэгчээс шалтгаалан гэрээний хугацаанд хэрэгжээгүй **2** ТАХ

Төлөвлөсөн ТАХ-ний хэрэгжилт
80%

ЭРХ ШИЛЖЭЭГҮЙ – 17 ТАХ

Гэрээний үнийн дүн
113,224.8
сая төгрөг

Барилга, байгууламж
16
ТАХ (94.1%)

ТЭЗҮ
1
ТАХ (5.9%)

Эрх шилжээгүй нийт 17 ТАХ-ээс:

- Гэрээний хугацаагаар он дамжин хэрэгжих ТАХ: **9** ТАХ
- Тухайн онд хэрэгжүүлж дуусахаар төлөвлөсөн ТАХ: **8** ТАХ

ХЭРЭГЖИЛТ



- Төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжиж, ашиглалтад оруулсан **7** ТАХ
- Гүйцэтгэгчээс шалтгаалан гэрээний хугацаанд хэрэгжээгүй **1** ТАХ

Төлөвлөсөн ТАХ-ний хэрэгжилт
87.5%

НИЙТ ДҮН	Нийт ТАХ	Эрх шилжсэн ТАХ	Эрх шилжээгүй ТАХ	Нийт гэрээний үнийн дүн	Нийт хэрэгжилт дунджаар
	37	20	17	305,897.2 сая төгрөг	83.8%

4 УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ТӨЛӨВЛӨСӨН САНХҮҮЖИЛТИЙН 40.9 ХУВИЙГ ЗАРЦУУЛААГҮЙ БАЙНА

ТӨЛӨВЛӨЛТ

Улсын төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтаар

37
төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн

82,197.2
сая төгрөгийн санхүүжилтийн дүн

ГҮЙЦЭТГЭЛ

34 ТАХ-д
40.9%
буюу

48,565.2
сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон

БУЦААН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ

31,841.7

сая төгрөгийн ашиглагдаагүй санхүүжилтийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НӨЛӨӨЛӨЛ



Барилга угсралт болон замын байгууламжийн гүйцэтгэгчдээс бодит ажлын гүйцэтгэл гараагүйгээс шалтгаалсан



Иргэд, олон нийтийн хүртэх үр өгөөж, боломж



Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж, иргэд олон нийтийн хүртэх боломжийг бууруулсан



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

5

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЖ, АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭН АВСАН ХӨРӨНГИЙН 80 ХУВИЙГ БҮРЭН ХҮЧИН ЧАДЛААР ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛАЖ БАЙНА

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-ын ашиглалт ба бүртгэлийн байдал

Нийт ТАХ:



102.6 тэрбум төгрөг



80%

зориулалтын дагуу ашиглаж байна




33.3%


НББ бүртгэсэн

Эрх шилжсэн ТАХ



Зориулалтын дагуу ашиглаж байна

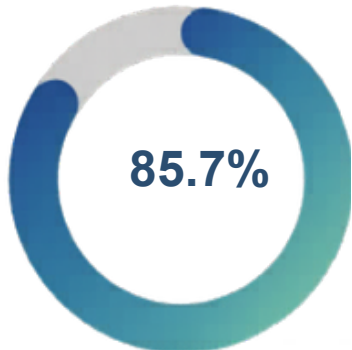

Эрх шилжээгүй ТАХ

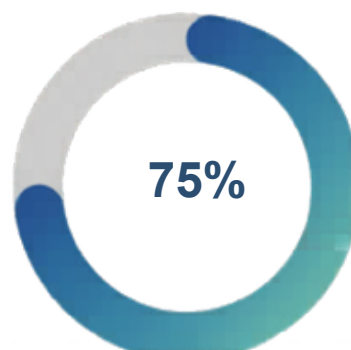

НББ бүртгэлд тусгасан

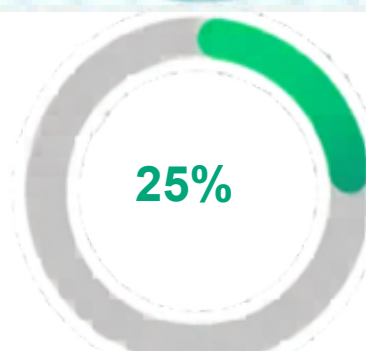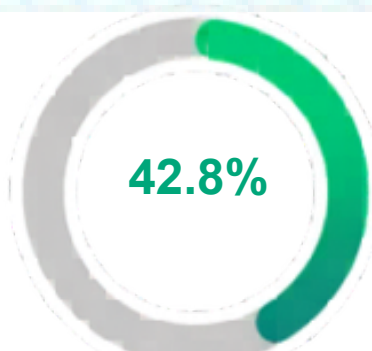

ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ХҮСЭЛТИЙГ ХОЛБОГДОХ ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛСЭН БАЙНА



5
төбзг

1
ЭХСайд

1
Ашиглагч
байгууллага



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ

8

АЛБАН
ШААРДЛАГА

5,062.3 сая
төгрөг

1

ЗӨВЛӨМЖ

1

УЛАМЖЛАХ
САНАЛ

Тухайн жилийн улсын төсвөөр баталсан хөрөнгө оруулалтын ажлыг үр дүнтэй гүйцэтгүүлж санхүүжилтийг бүрэн авах, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авах албан шаардлага

Замын байгууламжийг гүйцэтгэгч "Хурдны зам" ХХК-р улсын комиссоос өгсөн нөхөн сэргээлтийн ажлын үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, ашиглалтын явцад эвдэрсэн 10 ш түмбийг шинээр солих арга хэмжээ авах албан шаардлага

Улсын комиссын актаар байнгын ашиглалтад хүлээн авсан 2 худгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулж, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах албан шаардлага

Төсвийн тухай хуулиар баталсан хугацаа болон гэрээний хугацаанд ажлаа хэрэгжүүлээгүй дээрх гүйцэтгэгч нартай байгуулсан гэрээг дүгнэх арга хэмжээг авах албан шаардлага -2

Барилга угсралтын гүйцэтгэгч нараар стандартын дагуу мэдээллийн самбарыг байршуулах, түүнд хяналт тавьж ажиллах албан шаардлага-2

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Өгийнуур сумын 120 ортой хүүхдийн дотуур байрын эвдэрч гэмтсэн хэсгийг гүйцэтгэгч байгууллагаар засварлуулах, ашиглалтыг сайжруулах, албан шаардлага

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа барилга байгууламжийн материалын чанарт тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах зөвлөмж.

Эрчим хүчний сайдын багцаас санхүүжсэн 1,211.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй "Сумын төвийн 0.4 кВ-ын шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төсөл арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжсэн цахилгаан дамжуулах шугамыг төсөвт байгууллага болон айл, өрхүүдэд шилжүүлж, үр ашгийг дээшлүүлэх саналыг УАГ-аар дамжуулан ЭХЯ-нд уламжилж байна

