



Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар



Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн барилга 2026 оны 04 сарын 13-ны өдөр ашиглалтад орсон.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 45.5 хувь нь төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжиж дууссан байна.

Үндсэн мэдээлэл:

УИХ-ын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар "Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө"-ийг, 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар "Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө"-г тус тус баталсан.



Аудитын дүн



Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, ач холбогдлоор эрэмбэлж, олон нийтээр хэлэлцүүлэн, үе шаттай хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллаагүй байна.

Эрх шилжиж, он дамжин хэрэгжиж буй тул 5 төсөл, арга хэмжээнд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах шаардлага үүсээгүй байна.



Хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр нөлөө


Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн барилга ашиглалтад орсноор орчин үеийн техник, хэрэглэгдэхүүн ашиглах боломж бүрдэж, аюулгүй, эрүүл орчинд сурч боловсрох орчин бүрдсэн байна.

Аймгийн эрсдэл ихтэй 6.4 км цэвэр усны шугам, 5.8 км дулааны шугам, 8.8 км ариутгах татуургын шугамыг шинэчилж, 2 ус дулаан дамжуулах төвийг ашиглалтад хүлээн авснаар 5,824 өрхийг хангаж буй инженерийн шугам сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар сайжирч, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2025 ОНЫ ТӨСӨВ, САНХҮҮЖИЛТ



ЭРХ ШИЛЖЭЭГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ



Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж.



Засаг даргад зөвлөмж:

- Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг иж бүрэн, тооцоо судалгаа хийж, эрэмбэлэн, олон нийтээр хэлэлцүүлж байх.
- 2025 онд ашиглалтад хүлээн авсан Ф720 мм-ийн дулааны төв шугамд өргөлтийн насосыг холбох арга хэмжээ авч ажиллах.
- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, ашиглалтад хүлээн авсан Ф720 мм-ийн дулааны төв шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажил /Орхон, Баян-Өндөр сум/ - нуман хаалга /арк/-ыг гүйцэтгээгүй. Төв дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний өргөтгөл, ус дулаан дамжуулах төв барих ажил /Орхон, Баян-Өндөр сум, Цагаан чулуут, Наран баг/ - гадна генераторыг холбоогүй, ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор заслыг бүрэн дуусгаагүй ажлыг гүйцэтгэгчээр бүрэн гүйцэтгүүлж, хүлээн авах.
- Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг бодитой тоон мэдээлэл, судалгаанд үндэслэн зохиосон эсэхэд хяналт хэрэгжүүлэх.

Хотын захирагчийн албанд зөвлөмж:

- Төсөл, арга хэмжээ бүрээр баримт бичгийн сан үүсгэж, хяналт шалгалтын тоон мэдээллийг нэгтгэн тайлагнаж, удирдлагыг мэдээлээр хангах
- Барилга байгууламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн самбарыг гүйцэтгэгчээр стандартын дагуу хийлгэж, байршуулан, олон нийтэд ил тод мэдээлсэн эсэхэд хяналт тавих.


Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй, санхүүжилтийг хэрэгжих хугацаатай уялдуулаагүй төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөөр байна.

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 54.5% нь төлөвлөсөн хугацаандаа дуусаагүй, зарим төсөл, арга хэмжээ зогссон байна.

22.5-149.5

Барилга байгууламжийн үе шат бүрд хэрэгжиж буй захиалагчийн техник хяналтын үр нөлөөг сайжруулж, хариуцлагатай ажиллуулах шаардлагатай байна.

5 төсөл, арга хэмжээнд мэдээллийн самбар байршуулаагүй, мэдээллийн самбарыг стандартад нийцүүлэн шинэчлээгүй байна.



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ,
ҮР ДҮНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ВИЗУАЛ ТАЙЛАН



Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар



Орхон аймгийн ерөнхий
боловсролын 3 дугаар
сургуулийн барилга 2026
оны 04 сарын 13-ны өдөр
ашиглалтад орсон.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 45.5 хувь нь төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжиж дууссан байна.

Үндсэн мэдээлэл:

УИХ-ын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” -ийг, 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар “Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө”-г тус тус баталсан.



611

Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн хоёрдугаар хавсралтаар 29 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад нийт 8,735.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 611 төсөл, арга хэмжээг 2,914.9 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр баталжээ.

12

Орхон аймагт өмнөх оноос үргэлжлэн хэрэгжих 11, 2025 оноос эхлэн хэрэгжих 1, нийт 77.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 12 төсөл, арга хэмжээг 23.6 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр тусгасан байна.

91.6

Нийт санхүүжилтийн 91.6 хувийг барилга, байгууламжийн төсөл, арга хэмжээ эзэлж байна.

1

Тайлант онд шинээр хэрэгжихээр төлөвлөсөн ХХААХҮ-ийн сайдын багцад хамаарах 1 төсөл, арга хэмжээ Орхон аймагт хэрэгжээгүй байна.

106

Өмнөх оноос үргэлжлэн хэрэгжих 505, тухайн оноос эхлэн хэрэгжих 106 төсөл, арга хэмжээ байна.

5


Орхон аймагт хэрэгжих 12 төсөл, арга хэмжээний 5 нь Засаг даргад эрх шилжсэн.

7

Эрх шилжээгүй 7 төсөл, арга хэмжээ байна

9.6

Эрх шилжин, он дамжин хэрэгжиж буй 5 төсөл, арга хэмжээнээс 2 нь 2022 оноос хойш ажил хийгдээгүй зогссон, 3 төсөл, арга хэмжээ нь 2025 оны байдлаар 30-95 хувийн гүйцэтгэлтэй, тайлант онд 9.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна.

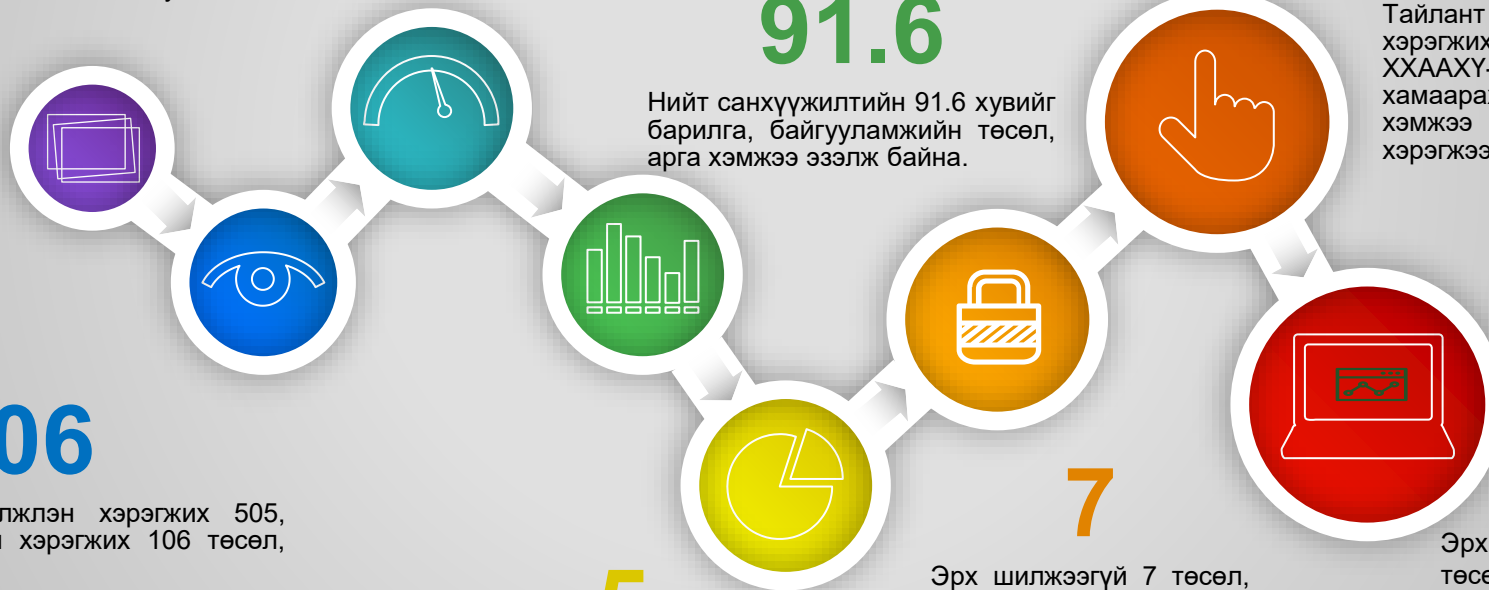

Аудитын дүн



Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, ач холбогдлоор эрэмбэлж, олон нийтээр хэлэлцүүлэн, үе шаттай хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллаагүй байна.

Эрх шилжиж, он дамжин хэрэгжиж буй тул 5 төсөл, арга хэмжээнд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах

шаардлага

үүсээгүй байна.

Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй, санхүүжилтийг хэрэгжих хугацаатай уялдуулаагүй төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөөр байна.

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний

54.5% нь

төлөвлөсөн хугацаандаа дуусаагүй, зарим төсөл, арга хэмжээ зогссон байна.

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системд холбогдох журам, аргачлалын дагуу нөхцөл байдлыг үнэлж, 22.5-149.5 оноо өгч эрэмбэлжээ.

22.5-149.5

Барилга байгууламжийн үе шат бүрд хэрэгжиж буй захиалагчийн техник хяналтын үр нөлөөг сайжруулж,

хариуцлагатай ажиллуулах шаардлагатай байна.

5 төсөл, арга хэмжээнд

мэдээллийн самбар байршуулаагүй, мэдээллийн самбарыг стандартад нийцүүлэн шинэчлээгүй байна.



Хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр нөлөө


Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн барилга ашиглалтад орсноор орчин үеийн техник, хэрэглэгдэхүүн ашиглах боломж бүрдэж, аюулгүй, эрүүл орчинд сурч боловсрох орчин бүрдсэн байна.

Аймгийн эрсдэл ихтэй 6.4 км цэвэр усны шугам, 5.8 км дулааны шугам, 8.8 км ариутгах татуургын шугамыг шинэчилж, 2 ус дулаан дамжуулах төвийг ашиглалтад хүлээн авснаар **5,824 өрхийг хангаж буй инженерийн шугам сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар сайжирч, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн** усаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2025 ОНЫ ТӨСӨВ, САНХҮҮЖИЛТ



ЭРХ ШИЛЖЭЭГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

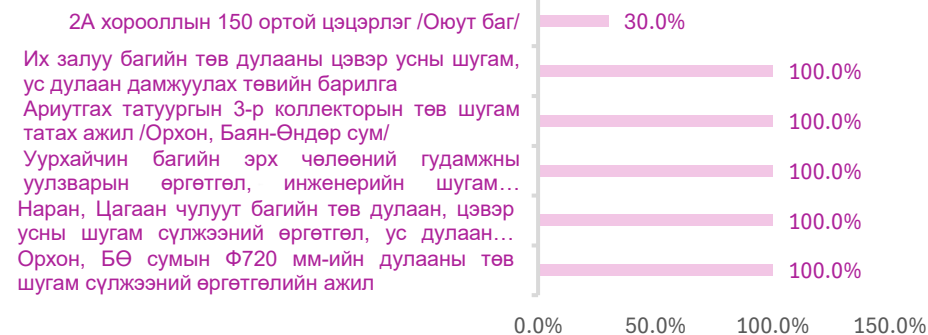

Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж.



АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ:

- Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаагүй төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.
- Орхон аймгийн Засаг даргад 2025 онд шинээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний эрх шилжээгүй тул худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулаагүй байна.
- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 54.5 хувь нь төлөвлөсөн хугацаандаа дуусаагүй, зарим төсөл, арга хэмжээ зогссон нь хөрөнгө оруулалтын үр нөлөөг бууруулж байна.

Засаг даргад зөвлөмж:

- ❖ Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг иж бүрэн, тооцоо судалгаа хийж, эрэмбэлэн, олон нийтээр хэлэлцүүлж байх.
- ❖ 2025 онд ашиглалтад хүлээн авсан Ф720 мм-ийн дулааны төв шугамд өргөлтийн насосыг холбох арга хэмжээ авч ажиллах.
- ❖ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, ашиглалтад хүлээн авсан Ф720 мм-ийн дулааны төв шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажил /Орхон, Баян-Өндөр сум/ - нуман хаалга /арк/-ыг гүйцэтгээгүй, Төв дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний өргөтгөл, ус дулаан дамжуулах төв барих ажил /Орхон, Баян-Өндөр сум, Цагаан чулуут, Наран баг/ - гадна генераторыг холбоогүй, ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор заслыг бүрэн дуусгаагүй ажлыг гүйцэтгэгчээр бүрэн гүйцэтгүүлж, хүлээн авах.
- ❖ Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг бодитой тоон мэдээлэл, судалгаанд үндэслэн зохиосон эсэхэд хяналт хэрэгжүүлэх.

Хотын захирагчийн албанд зөвлөмж:

- ❖ Төсөл, арга хэмжээ бүрээр баримт бичгийн сан үүсгэж, хяналт шалгалтын тоон мэдээллийг нэгтгэн тайлагнаж, удирдлагыг мэдээллээр хангах.
- ❖ Барилга байгууламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн самбарыг гүйцэтгэгчээр стандартын дагуу хийлгэж, байршуулан, олон нийтэд ил тод мэдээлсэн эсэхэд хяналт тавих.
